



N° 294-I



ELECTRO-TEST

V.Z.W.
ASBL

Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : T. Van der Lek
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : 33752146
N° comp :

Verslag van onderzoek

Rapport de contrôle

N° : 29 / 1083 / 02

Aard onderzoek :	AREI	86	87	88	95	97	270	271	276	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Nature du contrôle :	RGIE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Tijdelijk : Temporaire : <input type="radio"/>	Kermisinstallatie : Install. Foraine : <input type="radio"/>	Indienststelling : Mise en service : <input checked="" type="radio"/>	Uitbreiding : Extension : <input type="radio"/>	Vernieuwing : Renouvellement : <input type="radio"/>
---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Plaats van het onderzoek : Kolkvandenboom 10
Lieu du contrôle : 1785 Mersltem

Eigenaar : Dynamic Contact Adres : SA
Propriétaire : Dynamic Contact Adresse : SA

Installateur : J. Van BTW / TVA : 925 187 127

Datum van het onderzoek : 01/12/06 Ik. / C.I. : —

Date du contrôle : 01/12/06 Inspecteur : D. Smelt Kunt

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Appart.

Spanning : <u>2x230V</u>	Meter / bord verbinding : <u>VUB</u>	Max. beveiliging : <u>50A</u>
Tension : <u>2x230V</u>	Liaison compteur-tableau : <u>4x10²</u>	Prot. maximale : <u>50A</u>

Aardelektrode : <u>6 U.S.</u>	Isolatie : <u>23,2 Mohm</u>	Aantal verdeelborden : <u>1</u>
Electrode de terre : <u>2, 2 Ohm</u>	Isolément : <u>23,2 Mohm</u>	Nombre de tableaux : <u>1</u>

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels		Beschermde kringen - Circuits protégés : <u>16</u>	AREI / RGIE	
In (A)	Δ In (mA)		270	276
<u>40A</u>	<u>30mA</u>	<u>II Hoofd-dif -> Alle kringen</u>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>40A</u>	<u>30mA</u>	<u>III Bijzondere dif -> M. P.</u>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Opmerkingen / Remarques : *(zie keerzijde / voir verso)*

geen

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is ~~— niet —~~ conform met het AREI en mag ~~— niet —~~ ~~— tijdelijk —~~ in dienst gesteld worden ~~— in dienst blijven.~~
L'installation est ~~— n'est pas —~~ conforme au RGIE et peut ~~— ne peut pas —~~ ~~— temporairement —~~ être mise en service ~~— rester en service.~~

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
Het eëndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 04.12.1031
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de technisch directeur, pour directeur technique,
de inspecteur: l'inspecteur:

RAPP.ELSS1.02

NOTE AUX ENTREPRISES - Conformément à l'art. 14 du chapitre II du Titre II du Codex ce document doit être porté à la connaissance du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail.
NOTE AUX LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES - Conformément au RGIE vous êtes tenu : (1) de conserver ce procès-verbal dans le dossier de l'installation électrique; (2) de noter dans le dossier de l'installation électrique; (3) de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Economiques, direction "Energie électrique" tout accident survenu aux personnes, à imputer directement ou indirectement à la présence d'électricité.

TEL. : (02) 751.98.39
FAX : (02) 751.52.09
info@electro-test.be

Dexia 068-2117692-15
www.electro-test.be

HBC : 7341126000-33
IBAN : BE 79 7341 1260 0033
BIC : KREDBEBB

BE 0434.433.603
APR Brussel



N° 294-1



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : I. Verloek
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : 33455046
N° comp :

Verslag van onderzoek
Rapport de contrôle

N° : 29 / 1083 / 01

Table with columns for Aard onderzoek (AREI 86-97, 270-276, TT TN IT) and Voorsch. netbeheerder (RGIE, etc.)

Table with columns for Tijdelijk (Temporaire), Kermisinstallatie (Install. Foraine), Indienststelling (Mise en service), Uitbreiding (Extension), Vernieuwing (Renouvellement)

Plaats van het onderzoek : Kolkevenbos 10 A 1785 Merelbeke
Lieu du contrôle :

Eigenaar : Dynamie Contact Adres :
Propriétaire : Adresse :

Installateur : J. km BTW / TVA : 425 187 127

Datum van het onderzoek : 01/12/06 Ik. / C.I. :

Date du contrôle : 01/12/06 Inspecteur : De Smelt Kurt

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Appart.

Table with columns for Spanning (Tension), Meter / bord verbinding (Liaison compteur-tableau), Max. beveiliging (Prot. maximale)

Table with columns for Aardelektrode (Electrode de terre), Isolatie (Isolement), Aantal verdeelborden (Nombre de tableaux)

Table with columns for Differentieelschakelaars (Interrupteurs différentiels), Beschermd kringen (Circuits protégés), AREI / RGIE (270, 276)

Opmerkingen / Remarques : (zie keerzijde / voir verso)
VISUM :
Datum/date :

Besluit / Conclusion
De installatie is conform met het AREI en mag niet tijdelijk in dienst gesteld worden...
Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen...


NOTE AUX ENTREPRISES - Conformément à l'art. 14 du Codex ce document doit être porté à la connaissance du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail.

RAPP.ELSS1.02

Kalkovenlaan 10B
Mercktem

DYNAMIC CONSTRUCT
Liefdadigheidslaan 5
1860 Merx
425. 187. 127

MONO 220 V Δ
40A

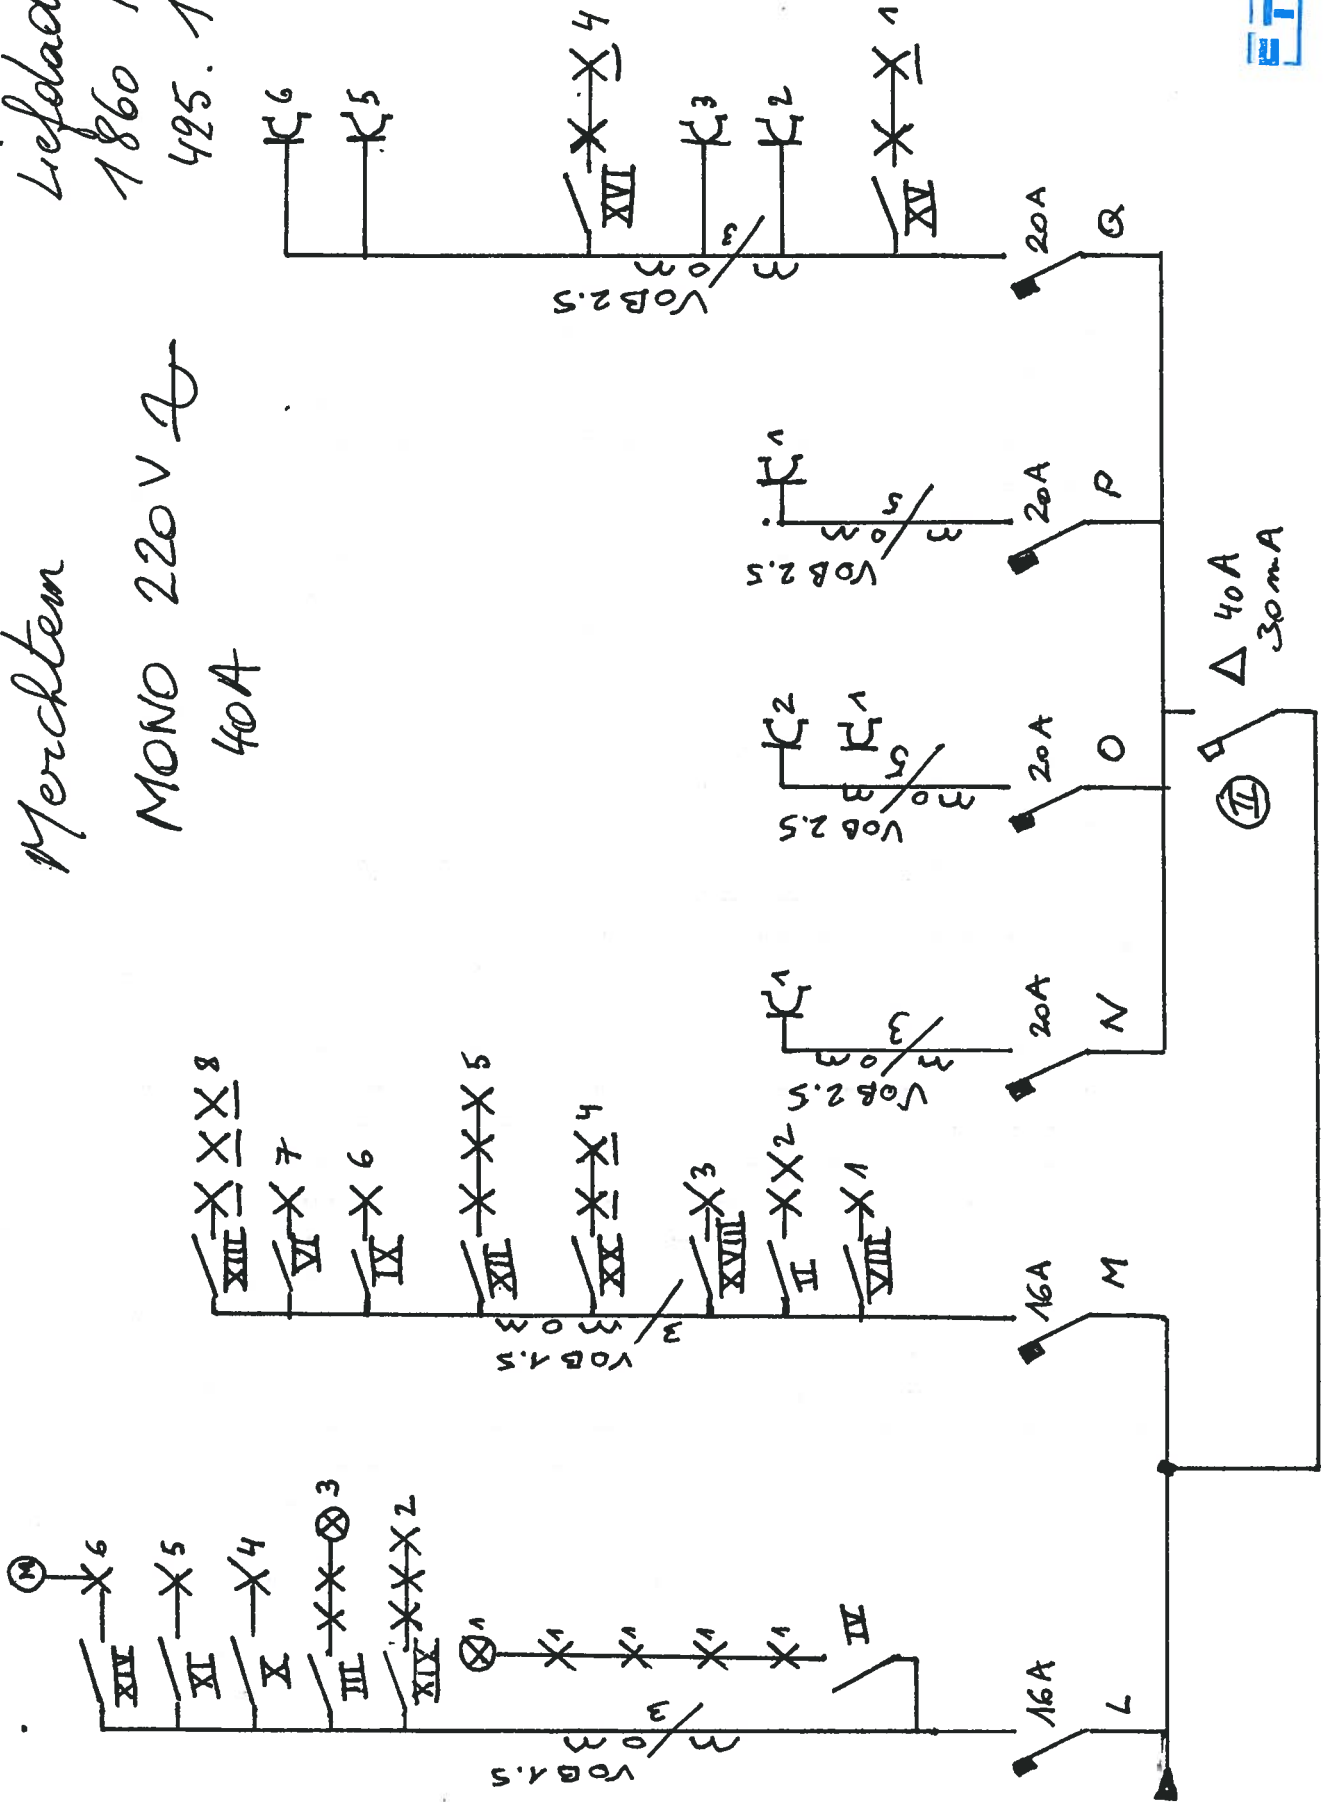

ELECTRO-TEST
Kurt DE SMEDT
G.s.m.: 047366 8374
