

Verslag nr: ISA 20230327 - 06

Redactiedatum : 27/03/2023

Apave Belgium v.z.w.

Entreprise 0871.547.374
Chaussée de Namur, 61
1400 Nivelles
Tél : +32(0)67/79.44.80
Fax : +32(0)67/79.44.84
E-mail : apave.be@apave.com

BELAC 305-INSP

OPDRACHTGEVER :

(privé aanvrager)
Samir El Isati
13 Edward van Esbroeckstraat
1840 Londerzeel
Belgique
0484997440

samir.elisati@hotmail.com

Apave kwaliteitsverzekering:

Agent-bezoeker: Salmanli Ilhan

N° mission : P124594

Gebruikte interne procedure: BEL 21.x

Datum van bezoek : 27/03/2023

Besluit van de controle :

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie "werden (of) waren" verzegeld. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór 27/03/2048

De agent-bezoeker, in opdracht van de directeur

De aanvrager, voor akkoord



Ilhan Salmanli



Verslag nr: ISA 20230327 - 06

Redactiedatum : 27/03/2023

Betreft de hieronder installatie :

Eigenaar, uitbater of beheerder :	Naam	Samir El Isati
	Adres	13 Edward van Esbroeckstraat 1840 Londerzeel Belgique
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk : (in geval van een voor indienststelling contrôle / vóór eerste gebruikname)	Naam	
	Adres	
	BTW nr	
Identificatie van de elektrische installatie :	Adres	13 Edward van Esbroeckstraat 1840 Londerzeel Belgique Maison unifamiliale
	D.N.B.	Fluvius
	Code EAN	n.c.
	Nr hoofdteller	1961968
	Nr teller nacht	/
	Private HS cabine	non
	Type installatie	wooneenheid

De volgende contrôle werd uitgevoerd :

Type huishoudelijke controle:	controlebezoek (6.5.)
hercontrole	neen
Data van de uitvoering van de installatie	vanaf 1/6/2020
Notas	néant
Gebruikte afwijkingen :	niet toegepast
Andere wettelijke referenties :	néant

Gegevens van de elektrische installatie :

Spanning en aard van de stroom:	2x230 V / 1N400 V
Type van de aardelektrode	Onbekend
Voedingsleiding :	VOB 6 mm ²
Aantal stroombanen :	20
Aardverbindingssysteem :	TT

Verslag nr: ISA 20230327 - 06

Redactiedatum : 27/03/2023

Aantal borden :	1		
Nominale waarde van de bescherming van de aansluiting	40A A		
Type van de algemene schakelaar	automaat met scheidingsfunctie		
Geplaatste differentieelstroominrichting(en)			
I_n	$I_{\Delta n}$	Type	Stroombanen
40 A	300 mA	A	A - T
40 A	30 mA	A	A - T
40 A	30 mA	A	Q - T
Beschrijving van de elektrische installatie :	ref. plannen:		
Beschrijving van de fotovoltaïsche installaties	z.o. aantal pannelen : P Wc pannelen : aant. omvormers : type en serienr omvormers : totale vermogen omvormers : / serienr groene tellers: index groene tellers : MID :		
Schema's en plannen van de installatie :			
Document met uitwendige invloeden :	geen beschrijving aanwezig		
Document van de veiligheidsinstallaties:	geen		
Document van de kritische installaties :	geen		
Andere documenten :			

Résultats van de controle :

Spreidingsweerstand van de aardverbinding:	14.5 Ohm
Waarde van de algemene isolatieweerstand:	5 MOhm
Test van de differentieelstroominrichtingen (testknop):	OK
Test van de differentieelstroominrichtingen (test foutlus):	OK
Continuïteit van de beschermingsgeleiders:	OK
Keuze van de differentieelschakelaars ivm spreidingsweerstand van de aarde	OK
Overeenstemming tussen de overstroombeveiliging en de doorsnede van de beschermde stroombaan	OK

Verslag nr: ISA 20230327 - 06

Redactiedatum : 27/03/2023

Exécution de l'installation électrique conformément aux schémas unifilaires et plans de position	OK
Elektrisch materieel (vast, vast opgesteld en verplaatsbaar / borden, toestellen, machines en elektrische leidingen)	OK
Controle van de aardinstallatie (aardelektrode, PE-geleiders, H-EV en B-EV)	OK
Vergrenzing van de hoofd differentieelschakelaar	was verzegeld
Test van de uitschakeling van de gedecentraliseerde productie-installatie(s) (minder dan 5 sec)	

Inbreuken :

/

Opmerkingen :

Geen

Observaties :

Geen

ALGEMENE INLICHTINGEN

- Les résultats s'appliquent uniquement aux travaux spécialisés dans la demande. La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
- L'inspecteur est autorisé à signer ce rapport en l'absence du dirigeant technique et est conscient qu'il engage la responsabilité de l'organisme Apave Belgique
- Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.

1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:

- a) het onderhoud ervan te verzekeren of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
- c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking het te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

2. De verkoper is ertoe gehouden:

- a) het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- b) het dossier van de installatie aan de koper bij eigendomsoverdracht te overhandigen;

De koper is ertoe gehouden:

- a) zijn identiteit en de datum van de verkoopakte mee te delen aan het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd;
- b) de werken, nodig om de tijdens het nieuwe controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, uit te voeren. Ze worden zonder vertraging uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen. Indien tijdens het aanvullende controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht. De verkoper en de koper zijn ertoe gehouden, onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt gesteld ter beschikking van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

BIJLAGEN :

Bijlagen :

Foto's borden en/of inbreuken



c67360f650703pu473677_20230327155256_a73c5f09-ceca-4f11-8c77-a86d81fb3cf3.jpg

Verlag nr: ISA 20230327 - 06


Redactedatum : 27/03/2023




[c67360f650703pu473677_20230327155302_c1afacd5-db20-4674-9b43-dec6845fa1e4.jpg](https://www.apave.be/verlag/ISA-20230327-06)




[c67360f650703pu473677_20230327160530_0b0c134b-46d0-4778-a4cd-e9b810a3b81b.jpg](https://www.apave.nl/verlagen/67360f650703pu473677_20230327160530_0b0c134b-46d0-4778-a4cd-e9b810a3b81b.jpg)

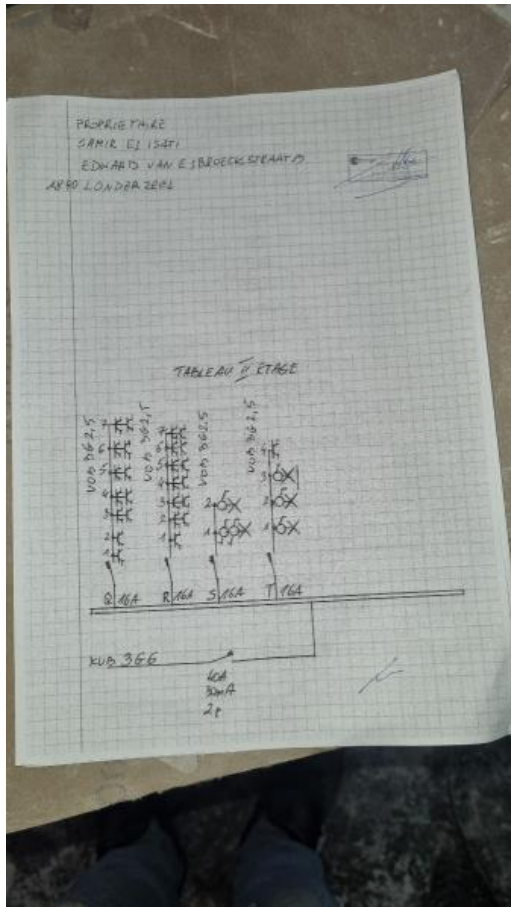


[c67360f650703pu473677_20230327160540_799b1cb2-aa84-49df-98c3-fe6788d1b20c.jpg](https://www.apave.be/verlagen/20230327160540_799b1cb2-aa84-49df-98c3-fe6788d1b20c.jpg)

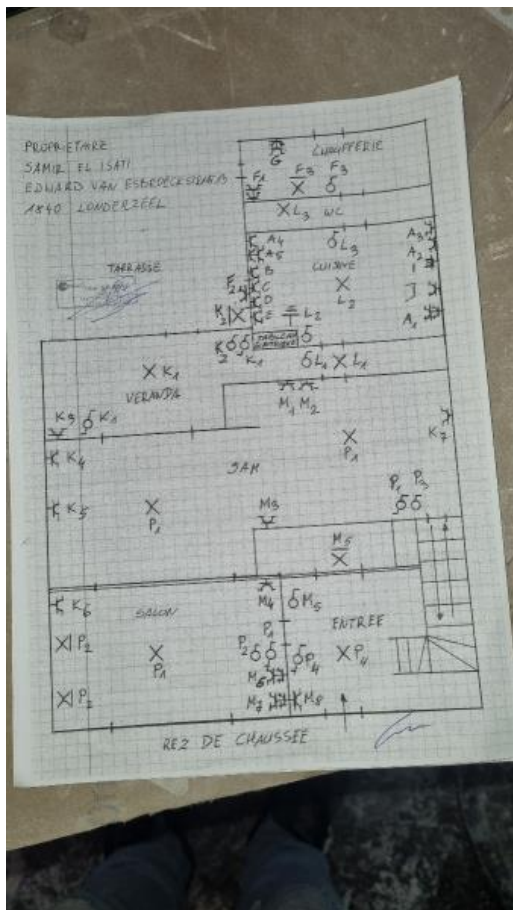

[c67360f650703pu473677_20230327160547_f155d76e-875b-4d9c-ac1b-e62894ac376f.jpg](https://www.apave.be/medias/attachment_data/attachment/c67360f650703pu473677_20230327160547_f155d76e-875b-4d9c-ac1b-e62894ac376f.jpg)

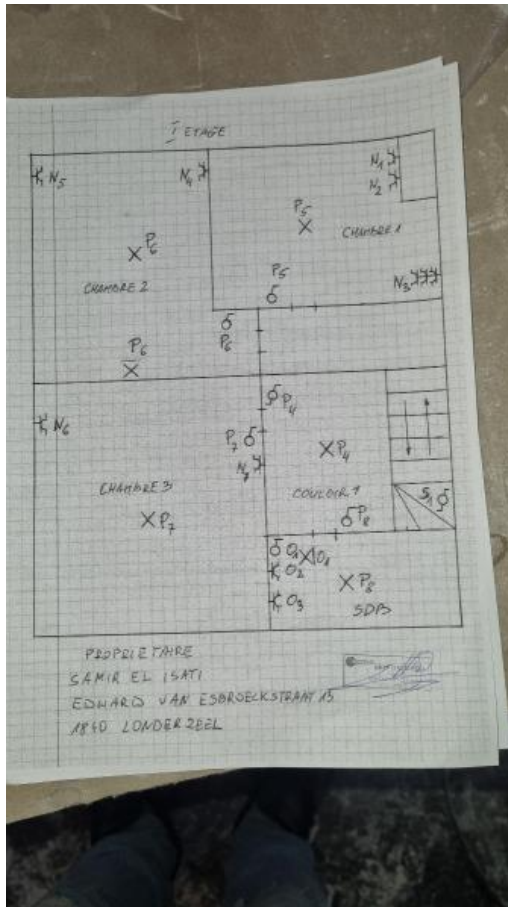

[c67360f650703pu473677_20230327160556_bf448abf-c7fd-4d5d-8f71-0f3c500d455c.jpg](https://www.fgov.be/medias/documenten/20230327160556_bf448abf-c7fd-4d5d-8f71-0f3c500d455c.jpg)

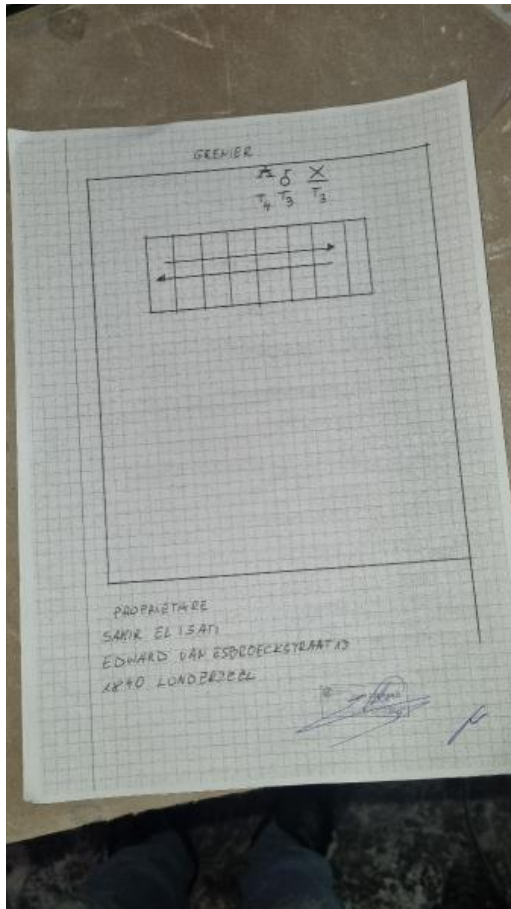

[c67360f650703pu473677_20230327160603_88df2fdf-0a43-43c8-a0e0-b33e85974dff.jpg](https://www.apave.be/verlagen/20230327160603_88df2fdf-0a43-43c8-a0e0-b33e85974dff.jpg)
